

TUDO QUE VOCÊ PRECISA PARA
ACELERAR SUA CARREIRA



VIA EXPRESSA PARA O SUCESSO EM
**GERENCIAMENTO
DE PROJETOS**



PATRICK HARPER-SMITH
& SIMON DERRY



H293v Harper-Smith, Patrick.

Via expressa para o sucesso em gerenciamento de projetos [recurso eletrônico] / Patrick Harper-Smith, Simon Derry ; tradução: João Eduardo Nóbrega Tortello ; revisão técnica: Gustavo Severo de Borba. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Bookman, 2011.

Editado também como livro impresso em 2011.
ISBN 978-85-7780-908-0

1. Administração. 2. Gerenciamento de projetos. I. Derry, Simon. II. Título.

CDU 658.5


Análise do Caminho Crítico

A análise do caminho crítico é uma técnica decisiva para os gerentes de projeto que estão procurando identificar maneiras de reduzir a duração de seu projeto – processo às vezes chamado de “mastigação do plano de projeto”. Ela pode ser uma técnica complicada de entender, mas (assim como no caso da maioria das ferramentas e técnicas) é essencialmente simples. Saber qual é o caminho crítico e como calculá-lo pode proporcionar a você uma real vantagem como gerente de projeto que utiliza a Via Expressa, apesar de ficarmos impressionados com o número de pessoas que não sabe calculá-lo ou para que ele serve.

A premissa básica do caminho crítico é a de que nem todas as atividades em seu projeto precisarão começar ao mesmo tempo para que seja cumprida a data de conclusão planejada para o projeto. Coloque todas as atividades em uma sequência ou ordem lógica. Estime a duração de cada tarefa e, então, crie uma agenda de projeto. Uma vez que você tenha feito isso, poderá começar a identificar onde há áreas que podem ser “mastigadas”. Siga este processo simples:

- 1 Estime os cronogramas.** Cronogramas precisos são fundamentais para uma agenda eficiente. Se você não souber quanto tempo levará para fazer algo, procure orientação e ajuda de outros gerentes que já possam ter feito algo semelhante. A experiência deles é crucial, pois fazer estimativas demasiadamente erradas nesse estágio de planejamento causará sérios problemas adiante. Certifique-se de envolver os membros de sua equipe nesse estágio, pois eles poderão ter ideias mais precisas acerca da duração de certas tarefas. Se estiver em dúvida, faça estimativas do melhor e do pior caso e use sua intuição para criar um compromisso.

2 Crie um diagrama de rede. Um diagrama de rede mostra o relacionamento entre as atividades e quais tarefas dependem da conclusão de outras tarefas. O diagrama será simples ou complexo, dependendo de quantas atividades existirem e de sua inter-relação. Os *post-its* podem ser úteis aqui, pois você pode escrever uma atividade separada em cada adesivo e depois dispor as anotações em uma sequência lógica. Um diagrama de rede simples é apresentado a seguir.

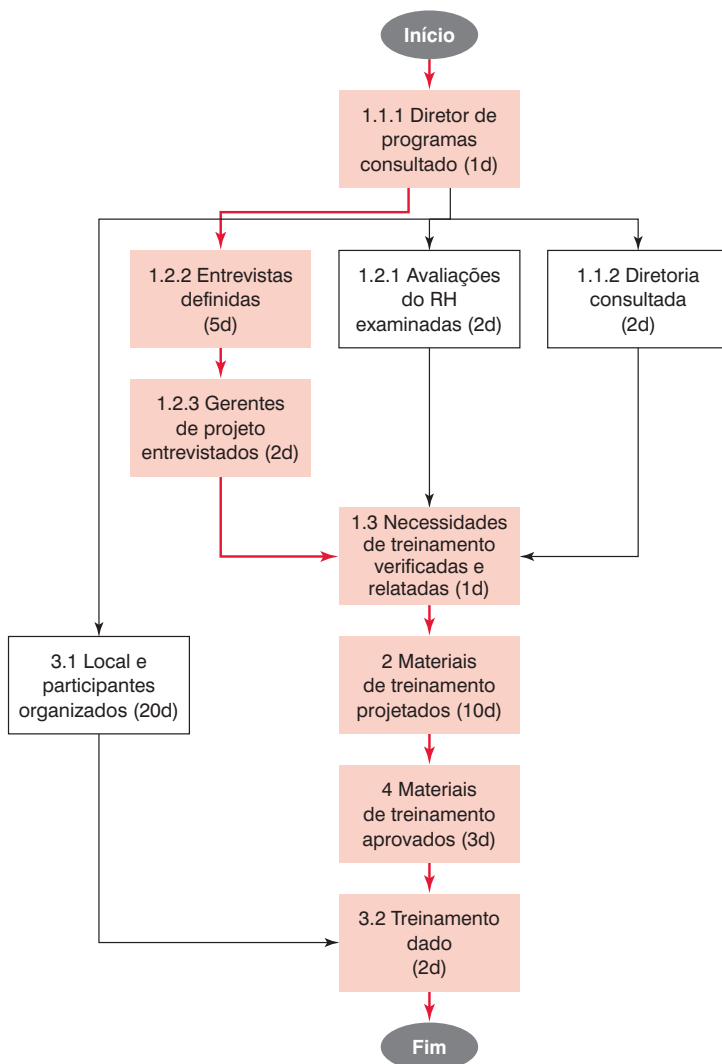

3 Estime o tempo total. Quando você tiver criado um diagrama de rede, provavelmente terá vários “caminhos” ou rotas do início ao fim. No exemplo anterior, após a tarefa 1.1.1 a rede se divide em quatro caminhos diferentes. Use as estimativas de duração de cada tarefa individual para fazer uma estimativa de caminho total por meio da soma de cada uma. A rota mais longa é conhecida como caminho crítico e mostra a menor duração possível para o projeto. No diagrama de rede apresentado, o caminho crítico está destacado em vermelho, e a duração total do projeto a partir do cálculo do caminho crítico é de 24 dias (24d).

E AGORA, O QUE FAZER?

O que o gerente de projeto que utilize a Via Expressa faz com o caminho crítico? Uma vez que tenha calculado o caminho crítico em seu projeto, você pode:

- **Saber a duração total de seu projeto.** O acesso a essa informação significa que você poderá planejar os recursos de modo adequado e tomar conhecimento de quanto precisa reduzir seu plano de projeto para cumprir a data final planejada (“mastigar o plano”).
- **Conhecer os riscos de atraso.** Se uma tarefa que está no caminho crítico atrasar por uma semana, então o projeto inteiro atrasará por uma semana. Os planejadores de projeto utilizam a análise do caminho crítico para identificar esses riscos e cenários decisivos.
- **Saber quanta “folga” as tarefas podem ter.** As tarefas que não estão no caminho crítico podem ter o que é conhecido como “tempo de folga”. Basicamente, elas têm uma “janela” na qual devem ser concluídas e, portanto, sabendo disso você pode planejar com flexibilidade. Contudo, se essas tarefas ultrapassarem esse período de folga, farão parte do caminho crítico e qualquer atraso adicional atrasará o projeto inteiro.
- **Decidir onde colocar recursos extras.** Se você quiser acelerar seu projeto e “reduzir” o plano de projeto, onde irá colocar os recursos extras para reduzir a duração? Nas tarefas que estão no caminho crítico, evidentemente. Diminuindo sua duração individual, você reduzirá o tempo do projeto global. Contudo, note que você só reduzirá a duração do projeto

global até o ponto em que o próximo caminho mais longo em seu diagrama de rede se tornar o caminho crítico.

- **Priorizar seu diário.** Já que, como gerente de projeto, você sem dúvida é a pessoa mais importante do projeto, e como sabe que as tarefas que estão no caminho crítico são fundamentais, a análise do caminho crítico lhe fornecerá um indício sutil sobre onde deverá estar para supervisionar o desempenho das tarefas.
- **Identificar gargalos ou limitações de recursos.** O caminho crítico identificará pontos de estrangulamento em seu projeto, onde se torna fundamental gerenciar o risco quanto aos recursos disponíveis. Examine seu diagrama de rede e veja onde os múltiplos caminhos passam todos por uma única tarefa. Esse é um gargalo, e você precisa planejar de forma adequada para garantir que essa tarefa entre no plano.
- **Comunique seus planos.** Explicando-se à equipe de projeto, aos *stakeholders* e aos “donos” de recurso qual é o caminho crítico, eles poderão ajudá-lo no planejamento e nos conflitos de recurso. Talvez você tenha de explicar o que é o conceito de caminho crítico para algumas pessoas, mas, uma vez que entendam sua importância – para você como gerente de projeto e para elas, em termos de ênfase e prioridades de tarefas –, elas poderão ajudá-lo de forma um pouco melhor.

O caminho crítico é uma das poucas ferramentas e técnicas que sugerimos que você, como gerente de projeto que utilize a Via Expressa, deve ter à disposição e aprender a usar o máximo possível. Sem essa técnica, você nunca ficará verdadeiramente confiante quanto à redução da duração de seus projetos ou a tornar-se eficiente e eficaz com os recursos.

Como gerentes de projeto externos, frequentemente estamos envolvidos em projetos que enfrentam dificuldades com os clientes. Fazemos três perguntas logo no início do trabalho com os clientes:

- **Quem é o principal *stakeholder*?** Queremos saber quem pode cancelar um projeto e quem está realmente interessado em apoiar o projeto em que vamos nos envolver.
- **Quais são os objetivos declarados?** Se não soubermos o que significa sucesso, não importa o quanto sejamos eficientes como gerentes de projeto ou consultores, nunca iremos “vencer”.

- **Qual é o caminho crítico do projeto?** Sem isso, teremos sérias dificuldades para recolocar o projeto no caminho certo e “reduzir” o plano de projeto. Se o cliente pergunta “Qual é o caminho crítico?”, nos perguntamos seriamente se ele sabe a dificuldade que o projeto está enfrentando e se ainda pode ser salvo. O caminho crítico é uma informação crucial no gerenciamento de projetos – sem a qual o gerenciamento de projetos se torna cada vez mais arriscado.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.
